Blueprint financeiro e de esforço

Nove meses de retainer lidos pelo que foi pago, pelo que a equipe dedicou e pelo que a automação multiplicou. Base para o orçamento de 2027.

Pago no período	Líquido estimado	Horas entregues	Banco de horas
R$ 671.241	R$ 590.241	4.788 h	1.591 h
bruto, nove meses	bruto menos R$ 9 mil/mês	dedicação da equipe	acima do retainer, a R$ 210

PREPARADO POR	PERÍODO	HORA BASE	REFERÊNCIA
PixelPulseLab	Jan – Set 2026	R$ 180 – R$ 240	R$ 210 / hora

Like:me · App, landing e API da plataforma de saúde e bem-estar (comunidade, marketplace, assinaturas, eventos, pagamentos).	42,2%
Colmeia + Banco de Ativos · Meus Roteiros (planejamento OOH), roteiro simulado, P1A, resultados e Banco de Ativos (inventário, exibidores, enriquecimento).	35,8%
Teste de Visibilidade · Image brand processing: processamento de imagem e medição de visibilidade de marca em mídia.	3,2%
Back-end e Suporte · Processos de back-end (pagamentos, reconciliação, e-mail, notificações, jobs, infra) e suporte ao usuário (Cadence, copiloto, WhatsApp, área do cliente).	18,8%

O valor de cada mês neste documento é o valor cheio do extrato. O líquido fica cerca de R$ 9 mil abaixo, por mês.

01 · LEITURA EXECUTIVA

O retainer cobriu uma parte da dedicação. A automação cobriu o resto da entrega.

BANCO DE HORAS

1.591 h
no cenário de R$ 210, acumuladas de janeiro a setembro

A equipe dedicou 4.788 h. O valor pago cobre entre 2.797 h (a R$ 240) e 3.729 h (a R$ 180). Em todos os meses a dedicação ficou acima da faixa. A R$ 210, o saldo vale R$ 334.194.

ROI DA AUTOMAÇÃO

424%
sobre o valor pago, com teto conservador de 3,5×

As 392.712 linhas entregues equivaleriam a 21.817 h de um time tradicional. Aplicado o teto, o esforço vale R$ 3.519.180. Cada real pago devolveu 5,24 reais de capacidade de mercado.

Os dois números não se somam. O banco de horas é dedicação humana acima do contrato. O ROI é o quanto essa mesma dedicação rendeu a mais por causa das automações. Um pede revisão de capacidade em 2027. O outro mostra que a produtividade já está acima do que a hora de mercado compraria.

FRENTE	HORAS	PARTICIPAÇÃO	VALOR RATEADO	COMMITS	CONCENTRAÇÃO
Like:me	2.023	42,2%	R$ 281.905	1.153	93,6% Eduarda
Colmeia + Banco de Ativos	1.713	35,8%	R$ 241.071	215	87,1% Jose
Teste de Visibilidade	152	3,2%	R$ 22.641	39	66,5% Jose
Back-end e Suporte	900	18,8%	R$ 125.624	98	67,0% Jose
Total	**4.788**	**100%**	**R$ 671.241**	**1.505**	**115 PRs**

Concentração é a parcela do código da frente escrita pela pessoa mais ativa. Acima de 80% é risco de pessoa-chave para 2027.

02 · PREMISSAS

Como os números foram montados

- Os valores vêm do extrato de janeiro a setembro de 2026 e entram cheios. O líquido estimado desconta R$ 9 mil por mês. Total bruto R$ 671.241. Total líquido R$ 590.241.
- A hora com o cliente fica entre R$ 180 e R$ 240. A referência do relatório é R$ 210. As horas cobertas pelo pagamento são o valor do mês dividido pela taxa.
- A dedicação é a jornada combinada, não a soma dos commits. Jose Roberto e Eduarda Weber entram com 180 h/mês (Eduarda a 90 h em agosto e setembro, quando o git dela quase para). Henrique Margarido entra em junho com 160 h/mês. Alex, da NTT Data, entra com 32 h/mês estimadas.
- O git decide a divisão. A jornada de cada pessoa é repartida entre as frentes na proporção dos commits daquele mês. Um mês com menos de um dia de código usa o histórico da pessoa, para um commit isolado não distorcer o mês.
- Entram 80 h/mês que não viram commit: ritos, suporte ao usuário, especificação e QA. 55% ficam em Back-end e Suporte. O restante segue o mix de código do mês. Junho e julho recebem mais 40 h cada da migração de backend registrada no workspace, sem commit de produto.
- O banco de horas do mês é a dedicação menos as horas cobertas pelo pagamento. O saldo acumula de janeiro a setembro, nos três preços da faixa.
- O ROI compara o volume entregue com 18 linhas úteis por hora, taxa conservadora de um time sem IA. O multiplicador medido foi 4,56×. O relatório aplica teto de 3,5× para não transformar volume de código em promessa.

REPOSITÓRIOS MEDIDOS

- Like:Me — likeme-back-end, likeme-front-end, LP-LikeMe
- Colmeia e Banco de Ativos — colmeia---meusroteirosdefault
- Teste de Visibilidade — image_brand_processing
- Back-end e Suporte — caminhos de cliente, Cadence, Twilio e dados dentro de LP-, mais correções operacionais dos outros repositórios

O QUE O GIT MEDE E O QUE ELE NÃO MEDE

As sessões de código somam cerca de 585 h. A dedicação usada no banco é 4.788 h. A diferença é arquitetura, rito com o cliente, suporte e o trabalho de quem não commita, como o Alex. Lockfiles, imagens e arquivos gerados ficam fora da conta de linhas.

03 · FINANCEIRO


O que entrou, mês a mês

Valor cheio do extrato. O líquido é o mesmo lançamento menos R$ 9 mil. As horas cobertas são o valor dividido por R$ 180 e por R$ 240.

MÊS	DATA	CANAL	LANÇAMENTOS	BRUTO	LÍQUIDO	HORAS A R$ 180 / 240
Jan	05/01/2026	SISPAG Fornecedores	42.230 + 10.411 + 12.600	R$ 65.241	R$ 56.241	363–272
Fev	06/02/2026	SISPAG Fornecedores	43.000 + 23.000	R$ 66.000	R$ 57.000	367–275
Mar	20/03/2026	SISPAG Fornecedores	23.000 + 47.000	R$ 70.000	R$ 61.000	389–292
Abr	20/04/2026	SISPAG Fornecedores	23.000 + 47.000	R$ 70.000	R$ 61.000	389–292
Mai	20/05/2026	Pagamentos a Fornecedores	23.000 + 47.000 + 10.000	R$ 80.000	R$ 71.000	444–333
Jun	19/06/2026	PIX	23.000 + 47.000 + 10.000	R$ 80.000	R$ 71.000	444–333
Jul	20/07/2026	PIX	23.000 + 47.000 + 10.000	R$ 80.000	R$ 71.000	444–333
Ago	20/08/2026	PIX	23.000 + 47.000 + 10.000	R$ 80.000	R$ 71.000	444–333
Set	21/09/2026	PIX	10.000 + 47.000 + 23.000	R$ 80.000	R$ 71.000	444–333
Total				**R$ 671.241**	**R$ 590.241**	**3.729–2.797**

> A partir de maio o extrato se repete em três lançamentos: R$ 23 mil, R$ 47 mil e R$ 10 mil. Esse desenho do pagamento fica no comprovante. O rateio deste blueprint segue o esforço de cada frente, medido no mês.

Horas entregues contra horas cobertas

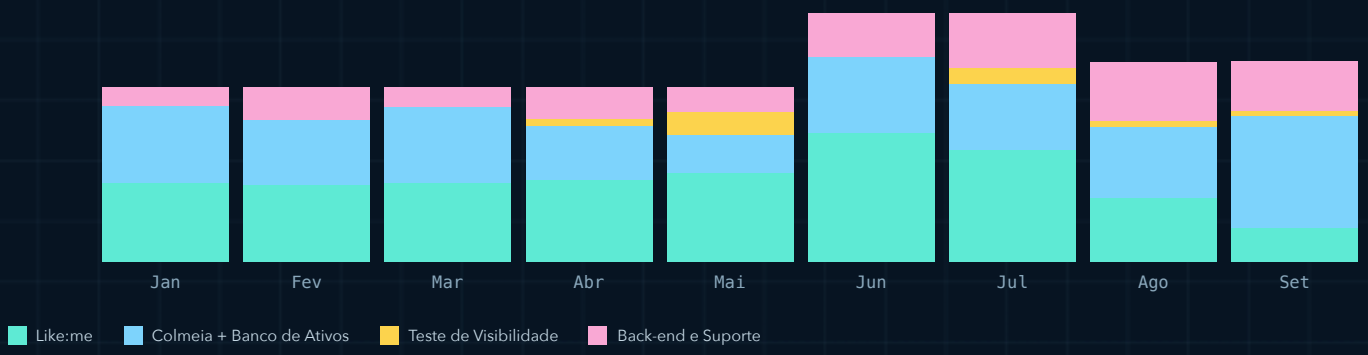


Cada barra é a dedicação do mês, já repartida. De maio em diante o pagamento cobre 381 h a R$ 210. A menor barra do período, em maio, entrega 472 h.

04 · RATEIO

Onde o valor fixo foi parar

O pagamento do mês é dividido na proporção das horas daquele mês. A soma de cada linha é o valor cheio do mês.

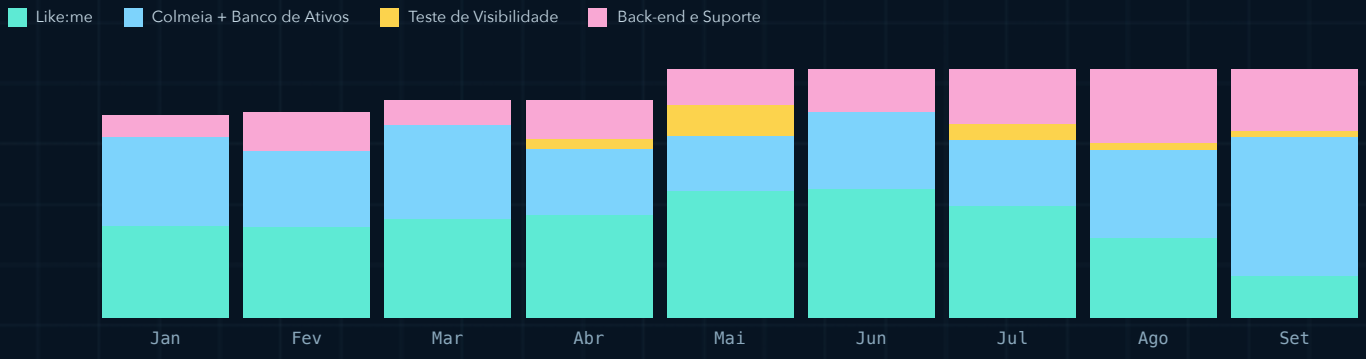

MÊS	LIKE:ME	COLMEIA + BANCO DE ATIVOS	TESTE DE VISIBILIDADE	BACK-END E SUPORTE	TOTAL
Jan	R$ 29.700 45,5%	R$ 28.511 43,7%	R$ 0 0,0%	R$ 7.030 10,8%	R$ 65.241
Fev	R$ 29.287 44,4%	R$ 24.316 36,8%	R$ 0 0,0%	R$ 12.397 18,8%	R$ 66.000
Mar	R$ 31.846 45,5%	R$ 30.396 43,4%	R$ 0 0,0%	R$ 7.758 11,1%	R$ 70.000
Abr	R$ 33.210 47,4%	R$ 21.318 30,5%	R$ 3.037 4,3%	R$ 12.435 17,8%	R$ 70.000
Mai	R$ 40.961 51,2%	R$ 17.549 21,9%	R$ 10.171 12,7%	R$ 11.319 14,1%	R$ 80.000
Jun	R$ 41.519 51,9%	R$ 24.641 30,8%	R$ 0 0,0%	R$ 13.840 17,3%	R$ 80.000
Jul	R$ 36.000 45,0%	R$ 21.451 26,8%	R$ 4.905 6,1%	R$ 17.644 22,1%	R$ 80.000
Ago	R$ 25.725 32,2%	R$ 28.294 35,4%	R$ 2.409 3,0%	R$ 23.572 29,5%	R$ 80.000
Set	R$ 13.657 17,1%	R$ 44.595 55,7%	R$ 2.119 2,6%	R$ 19.629 24,5%	R$ 80.000
Total	**R$ 281.905** **42,2%**	**R$ 241.071** **35,8%**	**R$ 22.641** **3,2%**	**R$ 125.624** **18,8%**	**R$ 671.241**

Like:Me lidera até julho. De agosto em diante Colmeia e Banco de Ativos, junto com Suporte, passam a receber a maior parte. Teste de Visibilidade aparece em blocos: abril–maio, julho e uma cauda de estabilização.

05 · QUEM FEZ

Profissionais, cota e o stakeholder

PixelPulseLab

Jose Roberto

Head de Tecnologia · Arquiteto de Soluções e IA

Horas	Commits	Dias no git
1.620 h	307	87

Like:me 65 h · Colmeia 1.190 h · Visib. 106 h · Suporte 259 h

PixelPulseLab

Eduarda Weber

Engenheira Full-stack Sênior (Like:me)

Horas	Commits	Dias no git
1.440 h	1.110	119

Like:me 1.376 h · Colmeia 0 h · Visib. 31 h · Suporte 33 h

PixelPulseLab

Henrique Margarido

Engenheiro de Dados e Back-end

Horas	Commits	Dias no git
640 h	88	27

Like:me 329 h · Colmeia 270 h · Visib. 0 h · Suporte 42 h

NTT Data

Alex

Arquiteto e Consultor Sênior (dados, cloud e governança)

Horas	Commits	Dias no git
288 h	—	—

Like:me 58 h · Colmeia 173 h · Visib. 0 h · Suporte 58 h · cota estimada, sem commit no período

STAKEHOLDER · FORA DO BANCO DE HORAS

Fabrício Guimarães · Like:Me

Acompanha priorização, validação de layout e aceitação das entregas, nos ritos de produto da Like:Me e nas frentes Be180 em que é chamado. Não compõe o esforço remunerado nem o banco de horas.

Eduarda Weber concentra 93,6% do código da Like:Me, e a presença dela no git cai em agosto. Jose Roberto concentra 87,1% do código de Colmeia e Banco de Ativos, além da arquitetura. Henrique Margarido, a partir de junho, é a segunda mão em dados e inventário. Alex segura a cota de arquitetura da NTT Data sem aparecer no git.

06 · ROADMAP REVERSO

O que foi construído, lido de trás para frente

Cada linha sai dos commits e dos merges do mês. É o roadmap que o código sustenta, não o que estava no slide de janeiro.

Like:me

42,2% do esforço · R$ 281.905

Jan	Anamnese e internacionalização do app. 213 commits, o mês de fundação do ano. 213 commits · 65 features · 43 correções · 215 h
Fev	Chat, autenticação e avatar. A experiência autenticada ganha corpo. 124 commits · 44 features · 35 correções · 209 h
Mar	Pico do ano: comunidade, landing e marketplace no mesmo mês. 286 commits · 84 features · 101 correções · 215 h
Abr	Auth no iOS, marketplace e termos do membro da comunidade. 97 commits · 30 features · 48 correções · 224 h
Mai	Pagamentos, release 1.3.2 e busca semântica de assinaturas. 161 commits · 58 features · 77 correções · 242 h
Jun	Comunidade em escala, métricas de pedidos pagos e testes de reconciliação. 183 commits · 37 features · 80 correções · 349 h
Jul	Eventos, notificações e correções tocadas por agentes de IA na API. 89 commits · 32 features · 33 correções · 302 h
Ago	O código da Like:Me desacelera. A dedicação restante é handoff e suporte. 174 h rateadas, sem commit no mês
Set	Frente de produto quase parada no git. O esforço do mês migra para Colmeia. 93 h rateadas, sem commit no mês

Teste de Visibilidade

3,2% do esforço · R$ 22.641

Jan, Fev, Mar, Jun: sem hora e sem commit.

Abr	Workers paralelos, heatmap e catálogo de fundos. 6 commits · 1 features · 3 correções · 21 h
Mai	Pico da frente: insights, adapter de vídeo e redesign da página de QA. 20 commits · 8 features · 7 correções · 60 h
Jul	Campanhas e desligamento controlado dos insights de IA no upload. 8 commits · 2 features · 2 correções · 41 h
Ago	Estabilização de storage. 3 commits · 0 features · 1 correções · 16 h
Set	Ajustes de Cloud Run. 2 commits · 0 features · 2 correções · 14 h

06 · ROADMAP REVERSO

Colmeia, Banco de Ativos e a camada de suporte

Colmeia + Banco de Ativos

35,8% do esforço · R$ 241.071

Jan — UX de conclusão e resultados em Meus Roteiros.
23 commits · 7 features · 6 correções · 206 h

Fev — 68 funções serverless consolidadas em 10 routers.
19 commits · 11 features · 4 correções · 174 h

Mar — Banco de Ativos e importação OOH com persistência de target.
28 commits · 15 features · 10 correções · 205 h

Abr — Módulo de acesso externo para exibidores.
3 commits · 2 features · 1 correções · 144 h

Mai — P1A, endpoint Databricks, media kit e rastreio de login.
26 commits · 13 features · 12 correções · 104 h

Jun — Indoor: storage de resultados e fechamento do fluxo.
30 commits · 20 features · 10 correções · 207 h

Jul — Dashboard de exibidores e Indoor na perspectiva do target.
26 commits · 11 features · 14 correções · 180 h

Ago — Fila gerencial de inventários e sugestão de de-para.
13 commits · 7 features · 6 correções · 192 h

Set — Impacto indoor, importação de simulado e prioridades de Q4.
47 commits · 28 features · 14 correções · 302 h

Back-end e Suporte

18,8% do esforço · R$ 125.624

Jan — Base mínima de correção operacional.
1 commits · 0 features · 1 correções · 51 h

Fev — Sequência de deploys da API.
10 commits · 0 features · 7 correções · 89 h

Mar — Migrations e rotina de deploy.
5 commits · 0 features · 1 correções · 52 h

Abr — Correções de teste e infra pontual.
2 commits · 0 features · 1 correções · 84 h

Mai — Reconciliação de pagamento e assinatura.
14 commits · 0 features · 10 correções · 67 h

Jun — Migração de backend (40h sem commit de produto) e e-mail transacional.
5 commits · 0 features · 4 correções · 116 h

Jul — Portal do cliente no ar, com entregas ao vivo, mais 40h da migração.
11 commits · 5 features · 5 correções · 148 h

Ago — Cadence entra na área do cliente, com boards e leitura de GitHub.
14 commits · 13 features · 1 correções · 160 h

Set — Copiloto em tela cheia. Cadence concentra 24 commits no mês.
36 commits · 19 features · 16 correções · 133 h

07 · BANCO DE HORAS

Todo mês entregou mais do que o pagamento cobre

Saldo do mês = horas entregues − valor ÷ taxa. O acumulado usa R$ 210. O saldo é hora trabalhada além do retainer, a tratar no orçamento de 2027.

MÊS	ENTREGUE	A R$ 180	A R$ 210	A R$ 240	SALDO 180	SALDO 210	SALDO 240	ACUMULADO
Jan	472	363	311	272	110	161	200	161
Fev	472	367	314	275	105	158	197	319
Mar	472	389	333	292	83	139	180	458
Abr	472	389	333	292	83	139	180	596
Mai	472	444	381	333	28	91	139	687
Jun	672	444	381	333	228	291	339	978
Jul	672	444	381	333	228	291	339	1.269
Ago	542	444	381	333	98	161	209	1.430
Set	542	444	381	333	98	161	209	1.591
Acumulado	**4.788**	**3.729**	**3.197**	**2.797**	**1.059**	**1.591**	**1.991**	**1.591**



A R$ 180

1.059 h
R$ 190.638

A R$ 210 · REFERÊNCIA

1.591 h
R$ 334.194

A R$ 240

1.991 h
R$ 477.912

O menor saldo mensal, no preço mais baixo da faixa, é maio: 28 h acima do pagamento. Junho e julho, com Henrique no time e a migração de backend, passam de 220 h de saldo cada um.

08 · ROI

A automação entregou o trabalho de um time maior

Linhas entregues	Multiplicador	Horas equivalentes	Custo da hora equivalente
392.712	3,5×	16.758	R$ 40
adições de código útil	teto sobre 4,56× medidos	time tradicional, já com teto	contra R$ 210 de tabela

O QUE ENTROU NA CONTA

- Agentes de código na API da Like:Me em julho, com 13 commits próprios e PRs de correção crítica.
- Copiloto e Cadence na área do cliente, de agosto a setembro, lendo repositório, board e dados no mesmo fluxo.
- Consolidação de 68 funções em 10 routers no Colmeia, em fevereiro, encolhendo a superfície que o time opera.
- Insights de imagem no Teste de Visibilidade, ligados em maio e desligados de forma controlada em julho.

COMO LER O RETORNO

Um time sem esse ferramental entrega em torno de 18 linhas úteis por hora, já com revisão. Nas 4.788 h dedicadas, isso daria cerca de 86.184 linhas. Saíram 392.712. A razão é 4,56×. O teto de 3,5× segura o número que vai para a conversa de orçamento: R$ 3.519.180 de capacidade equivalente, contra R$ 671.241 pagos.

A hora equivalente ficou em R$ 40. A hora de dedicação, em R$ 140. As duas cabem abaixo do piso de R$ 180.

> O ROI não pede desconto. Pede o contrário: a produtividade só se sustenta com o time que opera as automações. Tirar capacidade em 2027 reduz o multiplicador junto.

09 · ORÇAMENTO 2027

Três envelopes, a partir da dedicação média de 532 h/mês

01

Manter o retainer

R$ 80.000
/mês a R$ 210

O contrato segue em R$ 80 mil. As horas cobertas ficam abaixo da dedicação atual e o banco de horas continua crescendo.
Faixa cheia: R$ 68.571 a R$ 180 · R$ 91.429 a R$ 240 · o contrato de R$ 80 mil cobre cerca de 381 h/mês a R$ 210

02

Equilibrar

R$ 111.720
/mês a R$ 210

O retainer passa a cobrir a dedicação média de 2026, na taxa de referência. O banco para de crescer.
Faixa cheia: R$ 95.760 a R$ 180 · R$ 127.680 a R$ 240

03

Crescer

R$ 148.680
/mês a R$ 210

Soma uma engenharia sênior em tempo integral na Like:Me à dedicação média, para reduzir a concentração em uma pessoa.
Faixa cheia: R$ 127.440 a R$ 180 · R$ 169.920 a R$ 240

Manter os R$ 80 mil abre um buraco de cerca de 151 h por mês no ritmo médio de 2026. Em doze meses, o banco de horas receberia mais cerca de 1.812 h.

Onde aumentar o time

- **Like:Me, uma segunda engenharia sênior.** 93,6% do código está em uma pessoa, e agosto–setembro mostram a frente sem essa presença. O backlog já nomeado — programa GLP-1, Memed, teleconsulta, avatar e nota fiscal — não cabe no retainer atual.
- **Colmeia e Banco de Ativos, um engenheiro de produto.** Tira de Jose Roberto a execução do dia a dia (indoor, inventário, exibidores) e devolve a hora dele para arquitetura e para os agentes. Henrique segue como a capacidade de dados que a task force de inventário já usa.
- **Teste de Visibilidade, uma decisão explícita.** A frente existe e chegou a Cloud Run, heatmap e insights, mas pesa 3,2% do ano. Ou ganha um dono e um teto de horas em 2027, ou permanece spike, sem ser tratada como produto par do Colmeia.
- **Alex, NTT Data, se a pauta for plataforma.** As 32 h/mês cobrem arquitetura e governança. Um ano com camada de dados e cloud pede essa cota maior, ainda sem transformá-lo em capacidade de commit.
- **Suporte vira fila com dono.** 18,8% do valor foi operação: reconciliação, deploy, migração, Cadence e copiloto. Em 2027 isso merece meta de resposta, separada da entrega de produto.
- **Fabrício Guimarães segue como aceite.** Stakeholder da Like:Me, no rito de prioridade e layout. O planejamento de 2027 marca a cadência com ele. A hora dele não entra no banco.

10 · COMO USAR ESTE BLUEPRINT

O que levar para a conversa de orçamento

- Reconhecer o banco de 1.591 h no cenário de R$ 210, equivalente a R$ 334.194. O caminho recomendado é convertê-lo em capacidade de 2027, no envelope Equilibrar ou Crescer, em vez de faturar o saldo de uma vez.
- Travar a hora de referência dentro da faixa de R$ 180 a R$ 240. A R$ 210, equilibrar a dedicação média pede R$ 111.720 por mês.
- Separar produto de operação. Like:Me, Colmeia e Banco de Ativos têm roadmap. Suporte tem fila. Visibilidade precisa de uma decisão de escopo antes de receber meta.
- Tratar a concentração de código como risco de orçamento, não como detalhe de equipe. A segunda pessoa na Like:Me é o item que mais reduz esse risco.
- Manter as automações dentro do desenho do time. O multiplicador de 3,5× depende de quem opera agente, copiloto e Cadence. Cortar essa hora corta o ROI junto.

PAGO	DEDICAÇÃO	EQUIVALENTE
R$ 671.241 líquido R$ 590.241	4.788 h R$ 334.194 além do contrato	R$ 3.519.180 com teto de 3,5×

Premissas editáveis em scripts/report-financeiro/config.json: dedicação mensal, cota do Alex, horas não versionadas e o teto do multiplicador. Gerado em 21/10/2026, 14:25:26.
